ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Компьютерный набор описей первичных партийных организаций и волостных комитетов ВКП(б), не требующих переработки, силами волонтеров (студентов)

Комитет по делам архивов
Нижегородской области

2024 год

Паспорт проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Заказчик проекта:	комитет по делам архивов Нижегородской области
Периметр проекта:	комитет по делам архивов Нижегородской области, ГКУ ГОПАНО
Владелец проекта:	Пудалов Б.М., руководитель комитета
Руководитель проекта:	Соколова Т.В., заместитель руководителя комитета
Финансирование:	0,00 руб.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Проблемы

1. Наличие неполного комплекта 6 тысячи описей дел в ГКУ ГОПАНО и отражение этого показателя в паспорте архива.
2. Необходимость полного восстановления экземплярности описей дел в ближайшие годы.
3. Отсутствие необходимого бюджета рабочего времени сотрудников архива на проведение работы по компьютерному набору описей плохого качества, которые не могут быть оцифрованы путем сканирования.
4. Отсутствие необходимого бюджетного финансирования на проведение этой работы на возмездной основе силами сторонних организаций.

Риски

1. Отсутствие у студентов (волонтеров) опыта работы, определенных исторических и грамматических знаний, что может привести к ошибкам в компьютерном наборе заголовков дел описей.
2. Необходимость выделения большого бюджета рабочего времени на проверку набранных описей сотрудниками архива.

Цели

1. Восстановление комплектности описей архива и перевод их в электронный вид.
2. Увеличение количества описей в полном комплекте на 1,1% (120 описей).

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ	ТЕКУЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ИДЕАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество описей в полном комплекте	5362	5482	-

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Старт:	01.03.2024
Диагностика и планирование:	01.03.2024 - 10.04.2024
Внедрение:	11.04.2024 - 31.10.2024
Завершение:	01.11.2024
Анализ и доработка:	01.11.2024

Команда проекта

Руководитель рабочей группы проекта

Соколова
Татьяна Валерьевна

Заместитель руководителя комитета по делам архивов

Куратор проекта

Пудалов
Борис Моисеевич

Руководитель комитета по делам архивов

Заказчик проекта

Комитет по делам архивов Нижегородской области

Рабочая группа

Шестакова
Галина Александровна

Начальник отдела развития архивного дела, аналитической работы и информационной безопасности комитета

Оглоблина
Ирина Николаевна

Директор архива ГКУ ГОПАНО

Добровольская
Татьяна Геннадьевна

Заместитель директора архива ГКУ ГОПАНО

Карта текущего состояния процесса

Было 40 описей за 3 месяца (затрачено архивом 60 рабочих дней)

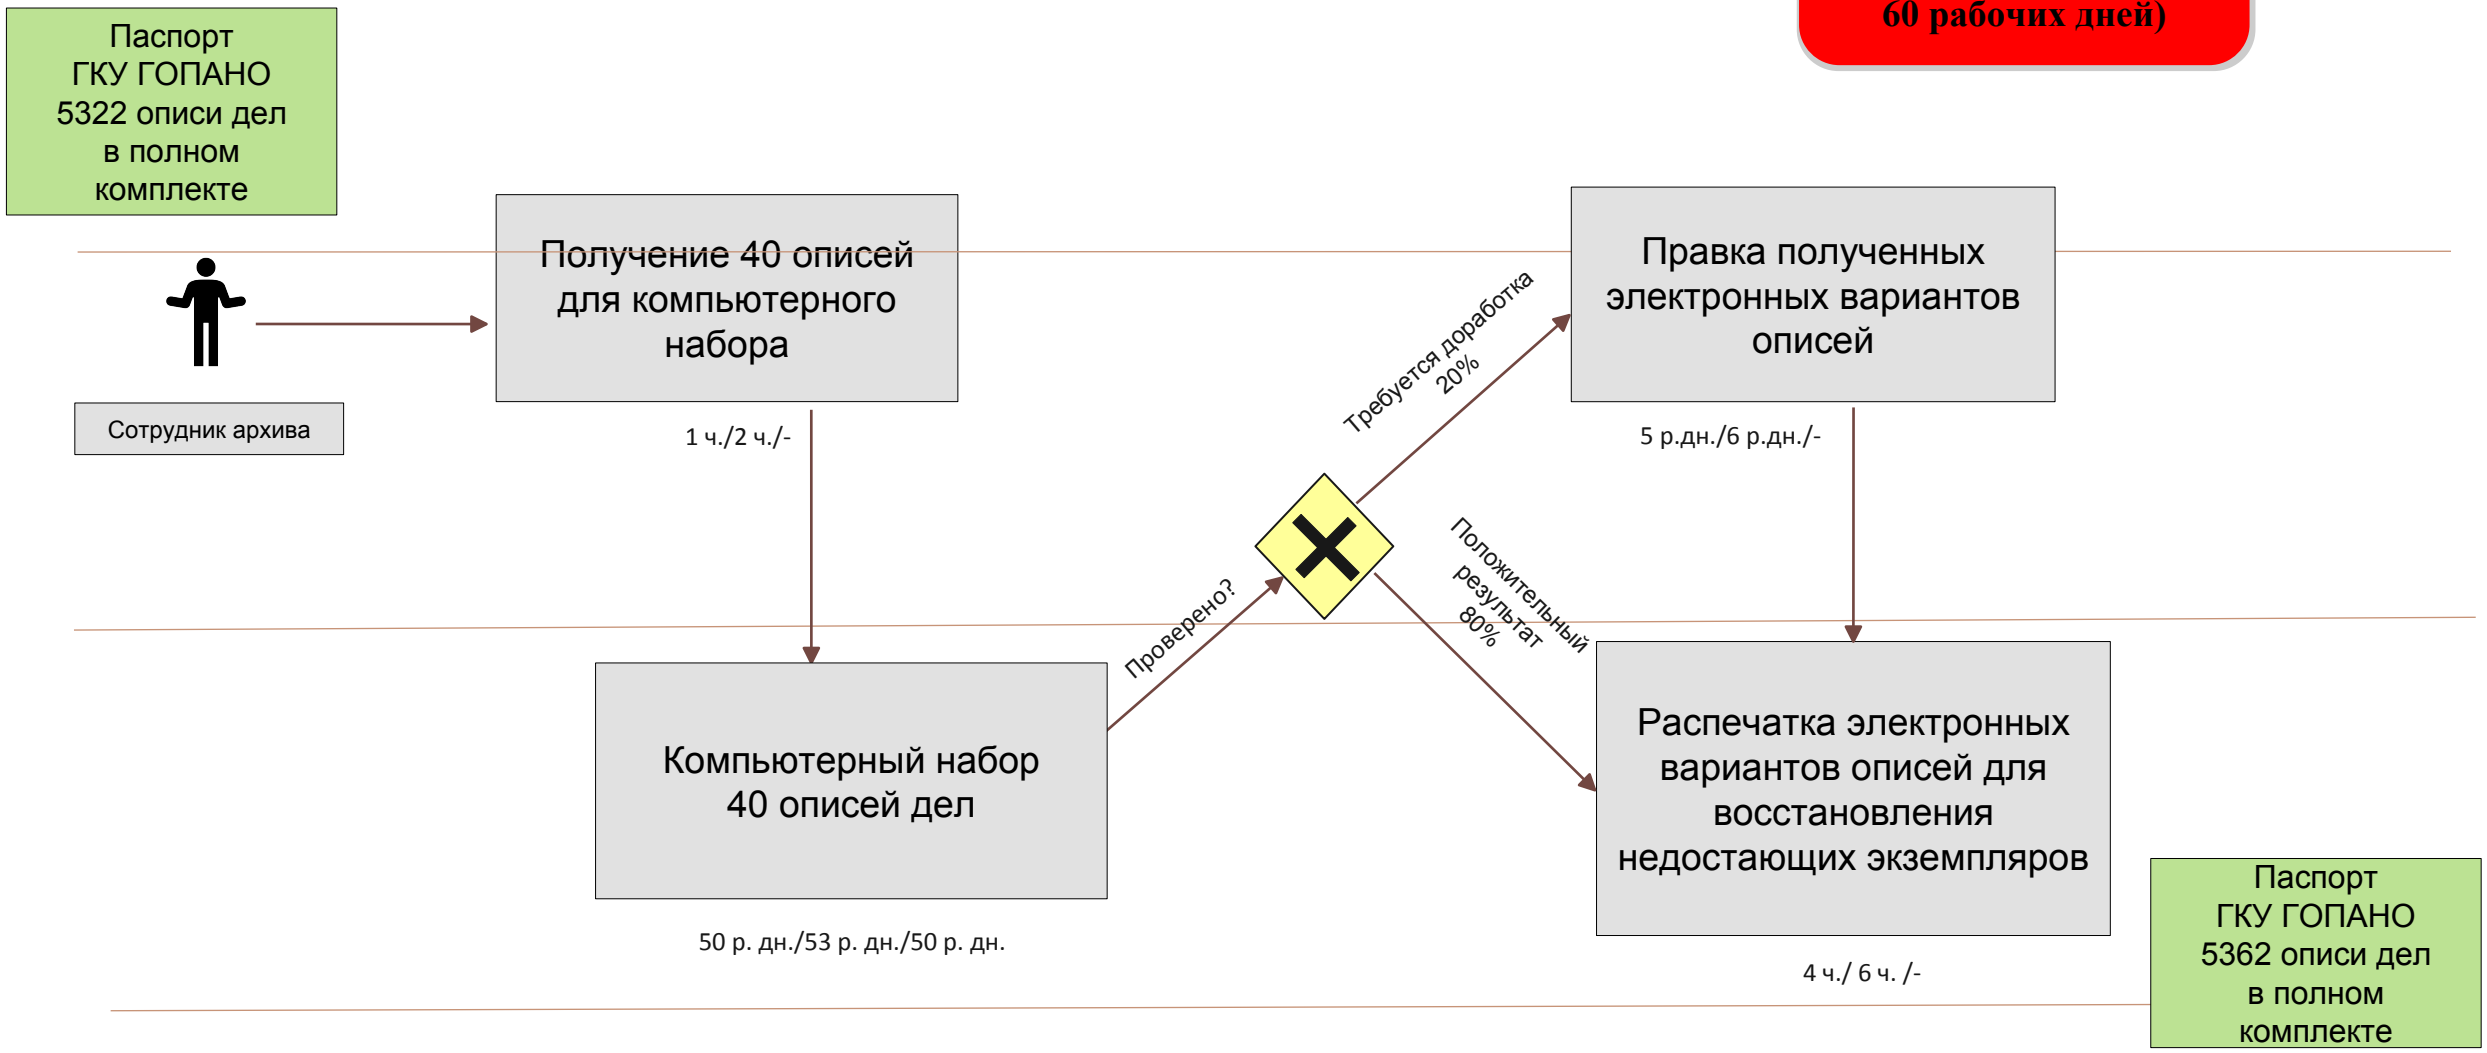

чистое время работы (ЧВР) / время работы с учетом потерь (ВП) / нормативное время (НВ)

Карта целевого состояния процесса

Стало 120 описей за 3 месяца (затрачено архивом 20 рабочих дней)

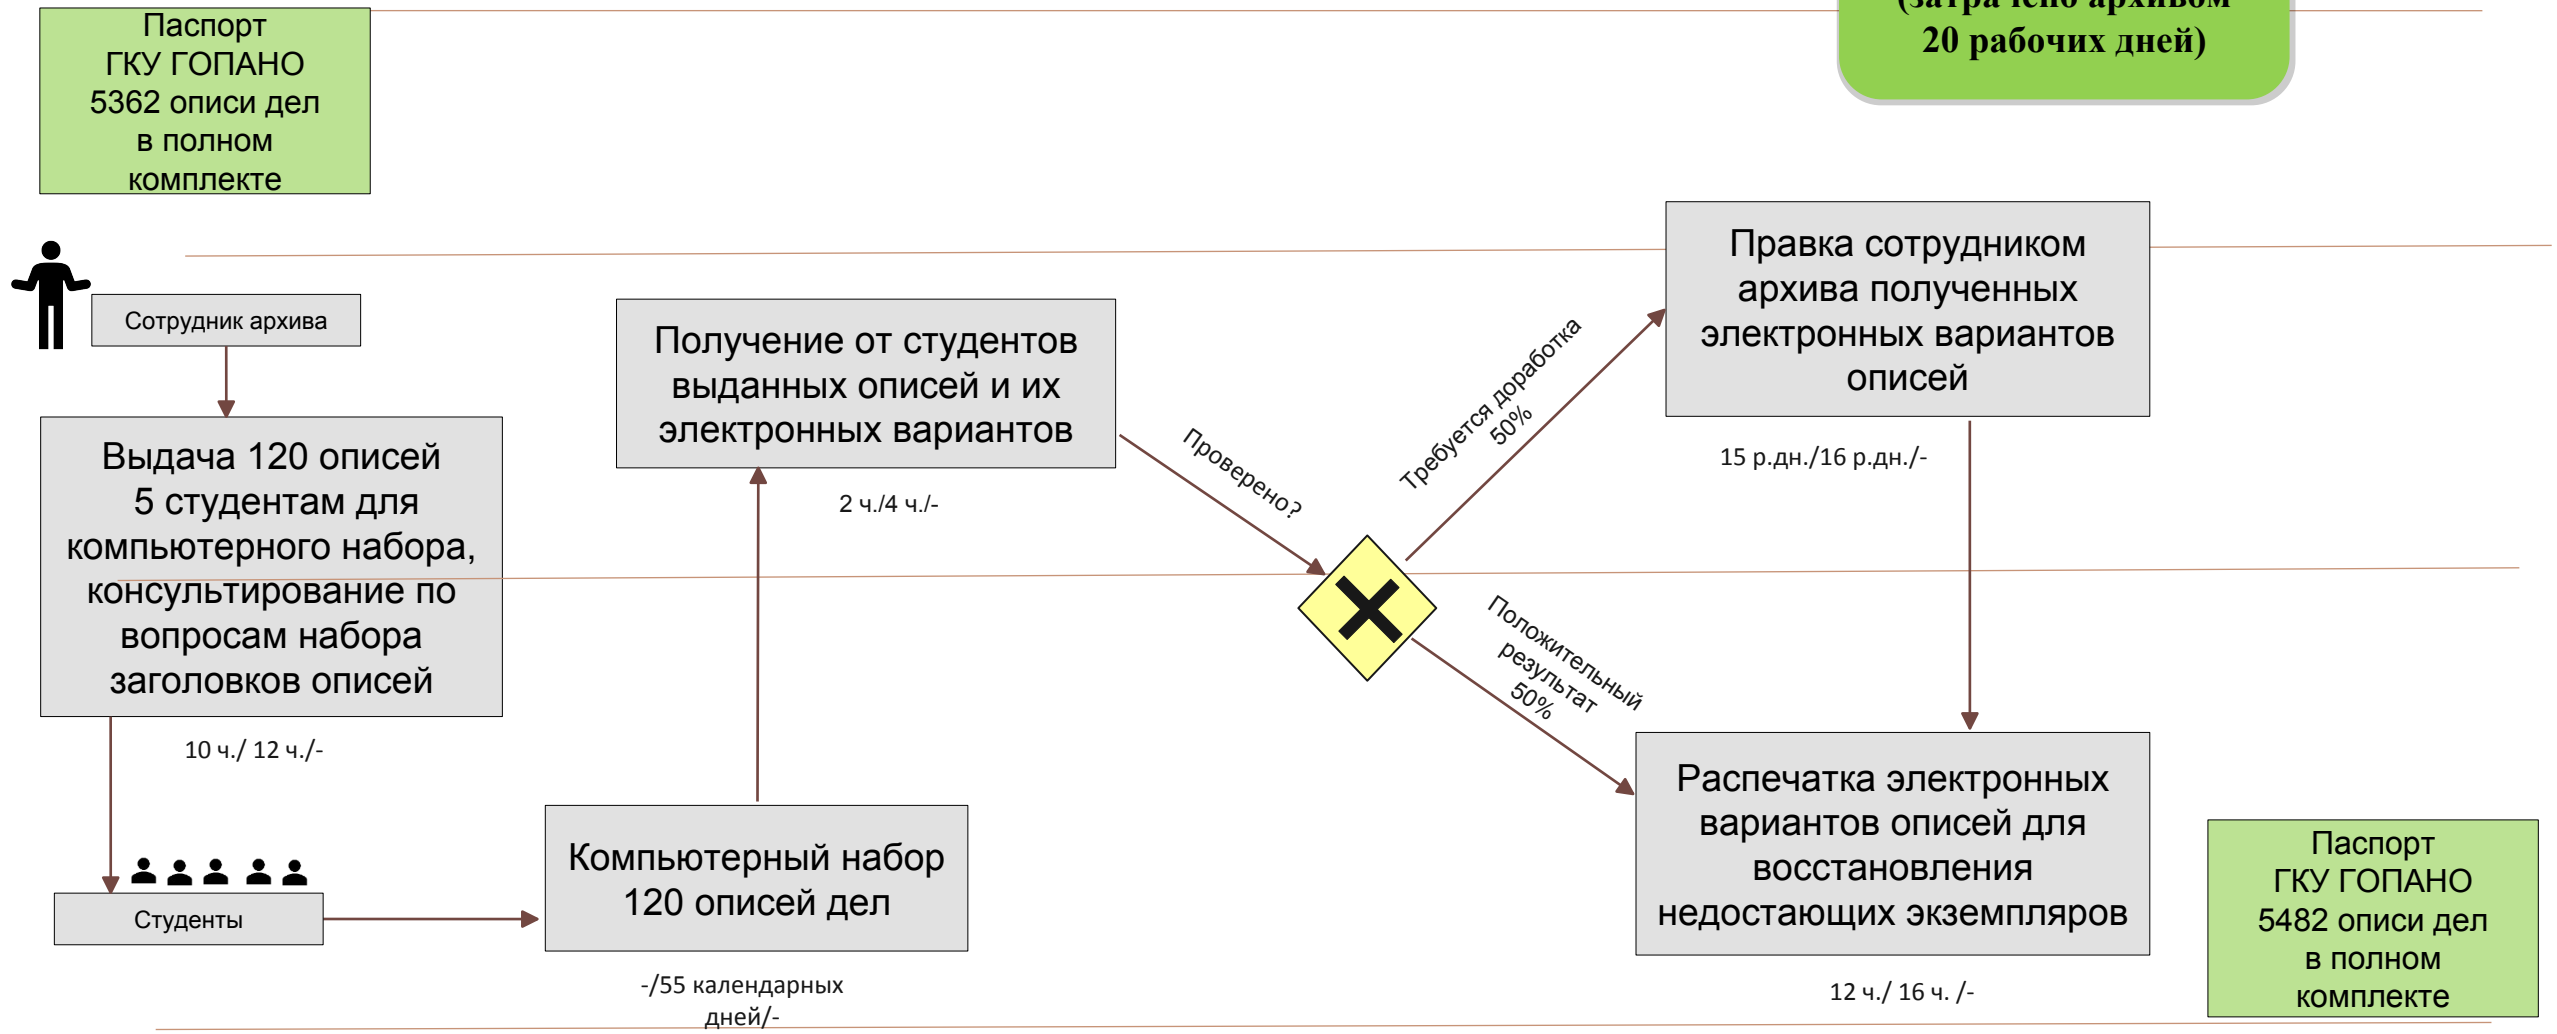

чистое время работы (ЧВР) / время работы с учетом потерь (ВП) / нормативное время (НВ)

Календарный план

№	Мероприятие	Ответственный	Срок	Результат
1	Подготовка дорожной карты проекта, определение путей достижения целевого состояния	Оглоблина И.Н. Добровольская Т.Г.	01.03.2024 – 07.03.2024	Подготовлена дорожная карта, определены пути достижения целей
2	Разработка текущей и целевой карт проекта, организация информационного стенда проекта	Шестакова Г.А. Оглоблина И.Н. Добровольская Т.Г.	11.03.2024 – 30.03.2024	Подготовлены текущая и целевая карты проекта
3	Выявление описей первичных партийных организаций и волостных комитетов ВКП(б) плохого качества, которые нуждаются в перепечатке, но не требуют переработки, подборка таких описей и подготовка к выдаче волонтерам (студентам)	Добровольская Т.Г.	30.03.2024 – 10.04.2024	Выявлено 120 описей дел первичных партийных организаций и волостных комитетов ВКП(б) плохого качества для компьютерного набора
4	Заключение договоров с волонтерами (студентами) по компьютерному набору описей	Оглоблина И.Н. Добровольская Т.Г.	11.04.2024 – 30.04.2024	Заключен договор с ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»
5	Выдача описей дел волонтерам (студентам) для компьютерного набора. Консультирование по вопросам набора заголовков дел описей. Компьютерный набор описей силами волонтеров (студентов)	Добровольская Т.Г.	30.04.2024 – 25.08.2024	Выдано и набрано силами студентов ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 120 описей
6	Получение от волонтеров (студентов) выданных описей и их электронных вариантов, проверка и возврат описей на места хранения, проверка и правка сотрудниками архива электронных вариантов описей. Распечатка описей для восстановления недостающих экземпляров. Начало эксплуатации созданных экземпляров. Подведение итогов.	Добровольская Т.Г.	26.08.2024 – 01.11.2024	Получено от студентов ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 120 описей. Проведены возврат описей на места хранения, правка электронных вариантов описей, распечатка недостающих экземпляров описей и начало их эксплуатации. Подведены итоги работы

Конечные результаты

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	БЫЛО	СТАЛО
Количество описей в полном комплекте	5362	5482
Обеспечено восстановление комплектности описей архива и перевод их в электронный вид, увеличено количество описей в полном комплекте на 1,1% (120 описей) за счет привлечения к компьютерному набору описей студентов ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж».		
